

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО Богданівська територіальна газова компанія

«3» 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі співробітник Грибак А.В., Борченко В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Богданівська територіальна газова компанія,
г. Буськ вул. Шевченка, 32 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 км L = 2 км, Ø 32 км, L = 20 км, Ø 25 км
L = 35 км, Ø 20 км L = 15 км, Ø 15 км L = 9 км,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Іроли пробільші Ø 50 км - 1 шт., іроли Ø 20 км - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; результати якізмер 15 газов,
мильна емульсія.
- ліквідація виявленіх витоків газу; поправлені, іроли Ø 50 км - 2 шт.,
іроли Ø 20 км, муфта Ø 20 км - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установленіх на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проверено,
під час при випробуванні надлишковий
тииск 500 міл. Ву. ст. за 5 х 6 секунд 5 км. Ву. с.
- дрібний ремонт газової апаратури і прладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими прладами та апаратами. проверено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Шустін Д.Л.
(прізвище, ініціали)


(підпис)

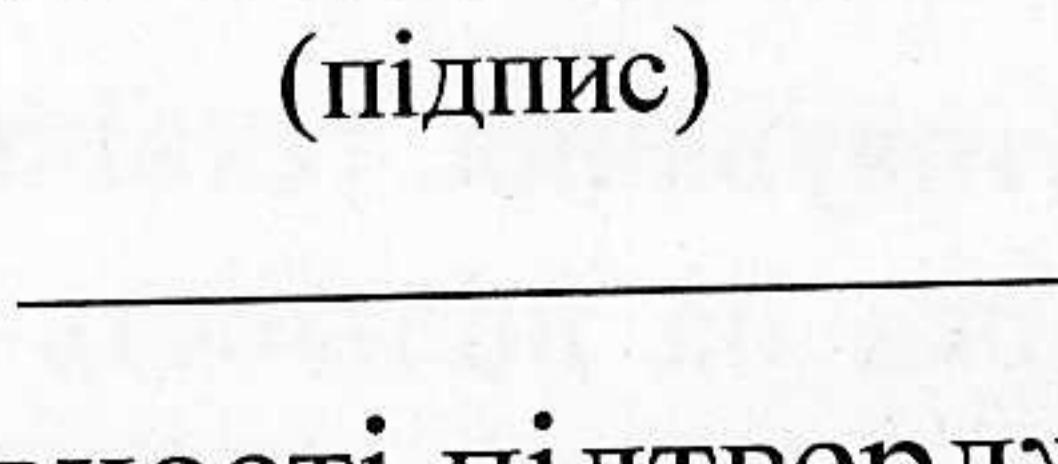
Члени бригади

Горбань О.В.
(прізвище, ініціали)
Борчанич В.В.
(прізвище, ініціали)


(підпис)


(підпис)

(прізвище, ініціали)


(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельниковій Ірина Святославівна Буцикіч
(прізвище, ініціали) ку тільки^(підпис) було виконано
старшина інженер Горбань О.В. 
